

令和 6（2024）年 12 月 13 日
上下水道局 建設課

し尿受入施設整備工事の進捗状況について（報告）

1 し尿受入施設整備工事の進捗状況・・・現時点で半年程度の工事遅延


工 種	受注者	契約金額 (当初)	進捗率 (11 月末)	契約日	履行期限	工事完了 見込み
土木建築	植木・阿部 特定共同企業体	709, 500 千円	65%	令和 5(2023)年 8 月 8 日	令和 7(2025)年 3 月 25 日	令和 7(2025)年 9 月 30 日
機械設備	昱工業・日新設備 工業 特定共同企業体	627, 000 千円	25%			
電気設備	村田・品田・新電気 特定共同企業体	569, 800 千円	15%			
工事監理 委託	(株) 日水コン 上越事務所	46, 343 千円	-	令和 5(2023)年 9 月 8 日		
合計		1, 952, 643 千円				

2 工事遅延の理由


- ・能登半島地震の復興優先により下請け業者と各種資材（電線、管類）の不足
- ・慢性的な半導体不足に加え、コロナ禍後の需要増加に伴う電気・機械機器の調達の遅れ

3 工事遅延による影響

【当初のスケジュール】

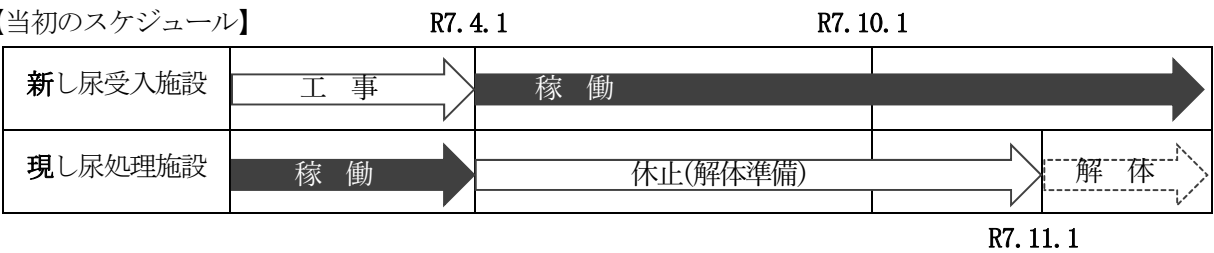

【工事遅延によるスケジュール】

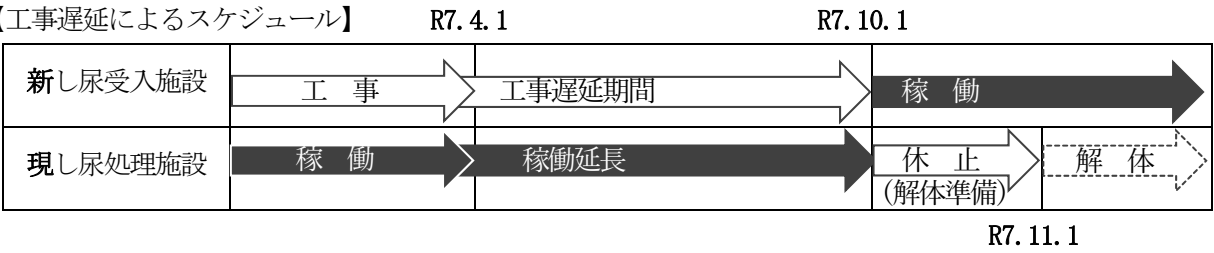

- ・工事遅延期間のし尿等の受入先は、現し尿処理場（松波 4 丁目地内）を稼働延長して対応する。
- ・現し尿処理場の解体始期は、令和 7（2025）年 11 月 1 日以降となっているため、新ごみ処理場の整備スケジュールには影響しない。

以上
