

新ごみ処理場整備の進捗状況について

1 新ごみ処理場整備・運営事業の概要

(1) 事業期間

建設工事 令和 7(2025)年 3 月 21 日～令和 11(2029)年 3 月 31 日(4年間)

運営事業 令和 11(2029)年 4 月 1 日～令和 31(2049)年 3 月 31 日(20年間)

(2) 事業費 建設工事 21,794,773 千円 運営事業 13,000,427 千円

(3) 契約先

建設工事 カナデピア・大原・植木・阿部・東北・中澤特定建設工事共同企業体

運営事業 柏崎環境テクノロジー株式会社

2 建設工事の概要


(1) ごみ焼却施設(エネルギー回収型廃棄物施設)

処理能力 80 t /日、発電能力 1,710KW

(2) 不燃・粗大ごみ処理施設(マテリアルリサイクル施設)

処理能力 6.7t/5h

<完成予想図>

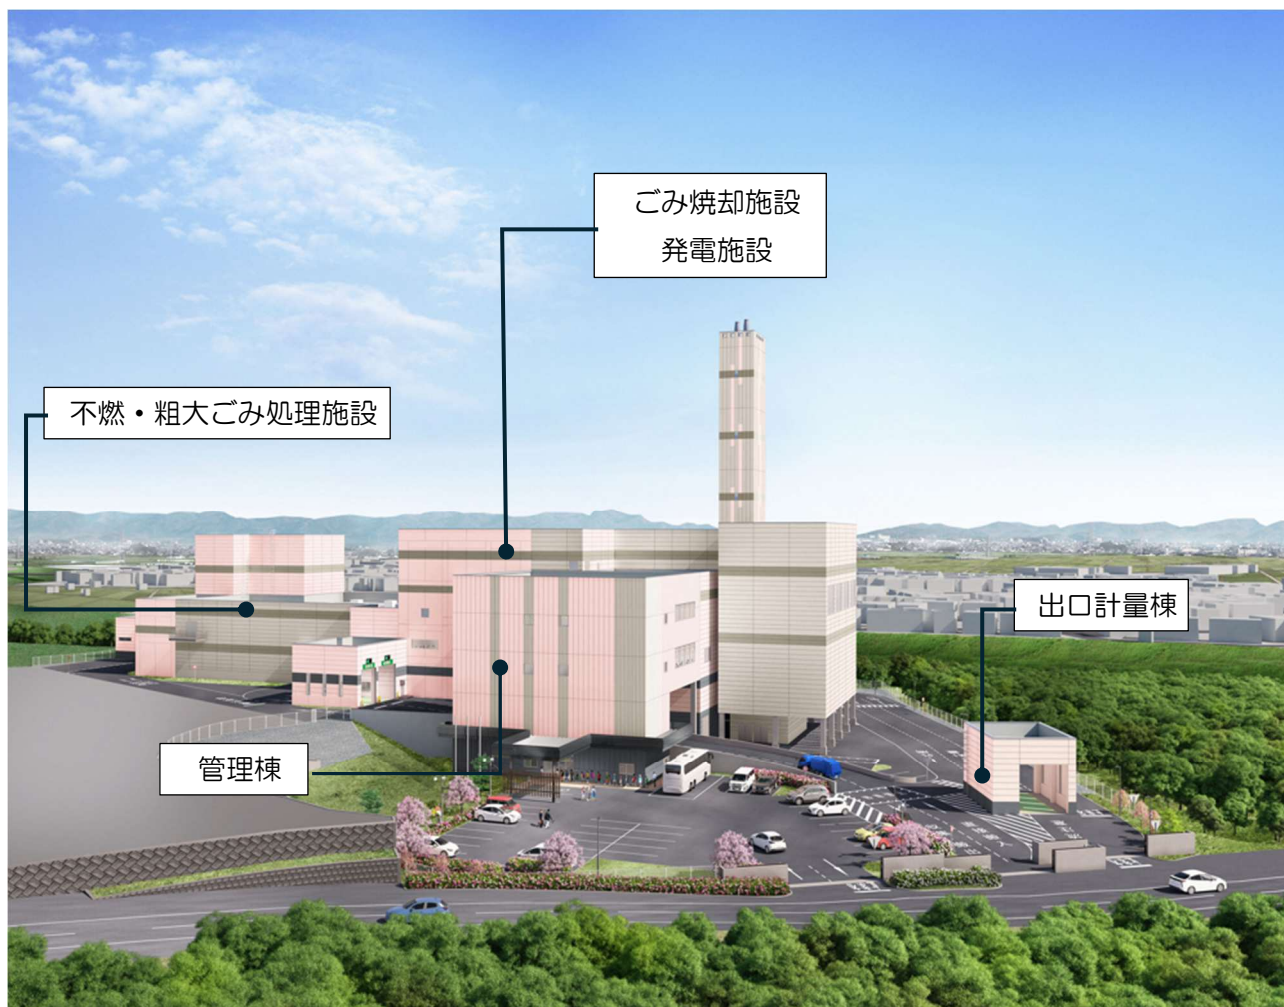

3 建設工事の進捗状況


(1) 令和7（2025）年度実績

- ・ 仮設事務所及び仮設計量棟の建設
- ・ 松波資源物リサイクルセンター及び事務所等の解体
- ・ 基本設計及び詳細設計を実施

(2) 令和8（2026）年度予定

- ・ 主に、旧し尿処理施設の解体工事と基礎杭打設などの土木工事を実施
- ・ 8月中を目途に、旧し尿処理施設の解体を完了
- ・ 8月～12月にかけて、基礎杭打設工事を実施
- ・ その後、山留・掘削工事、基礎工事に順次着手

(3) 全体スケジュール

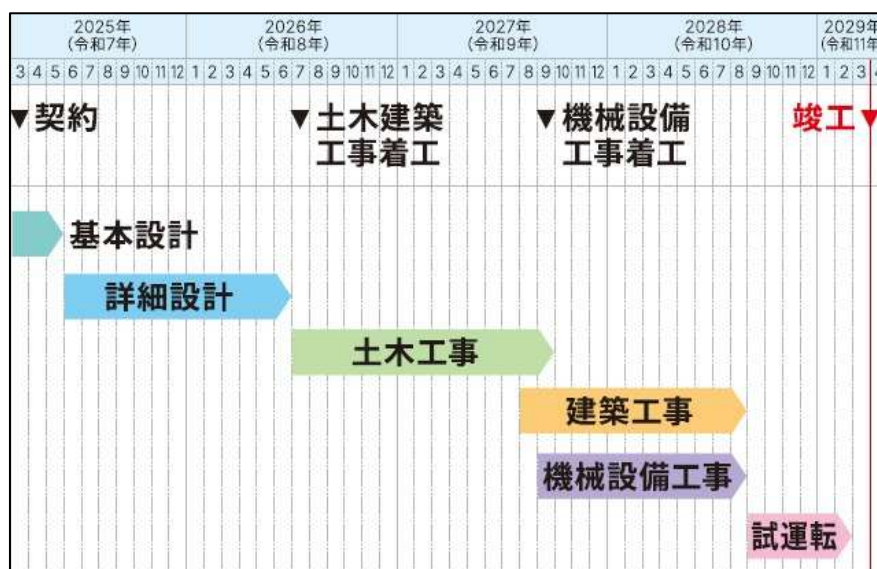

(4) 工事状況



航空写真(R8(2026).7.22 撮影)



し尿処理施設解体状況
