

新ごみ処理場整備及び関連事業の取組状況について


市民生活部環境課

新ごみ処理場整備プロポーザルにおける事業者提案が提出されたことを受け、新ごみ処理場整備及び関連事業の取組状況と今後の方針について報告します。

1 新ごみ処理場整備事業の今後の予定

- 12 月下旬に外部委員を含む審査委員会にて審査し、最優秀提案者を決定する予定
- 令和 7（2025）年 2 月上旬までの契約協議を経て、新ごみ処理場整備の提案概要を総務常任委員協議会（2 月予定）にて報告し、2 月定例会議（3 月予定）に本契約を上程する予定
- 令和 7（2025）年 4 月以降、新ごみ処理場の設計を進めながら既設建屋等の取壊しを開始
9 月 仮設事務所設置、10 月 事務所機能移転、11 月 ごみ等搬入動線切替え
11 月 事務所棟、し尿処理場、リサイクルセンター等の解体に着手し、新ごみ処理場建設へ
- 債務負担行為内の令和 7（2025）年度分建設費用のほか、工事の施工監理費、事務所や既存施設の機能移転等に必要な予算を順次上程する予定

＜クリーンセンター配置図＞

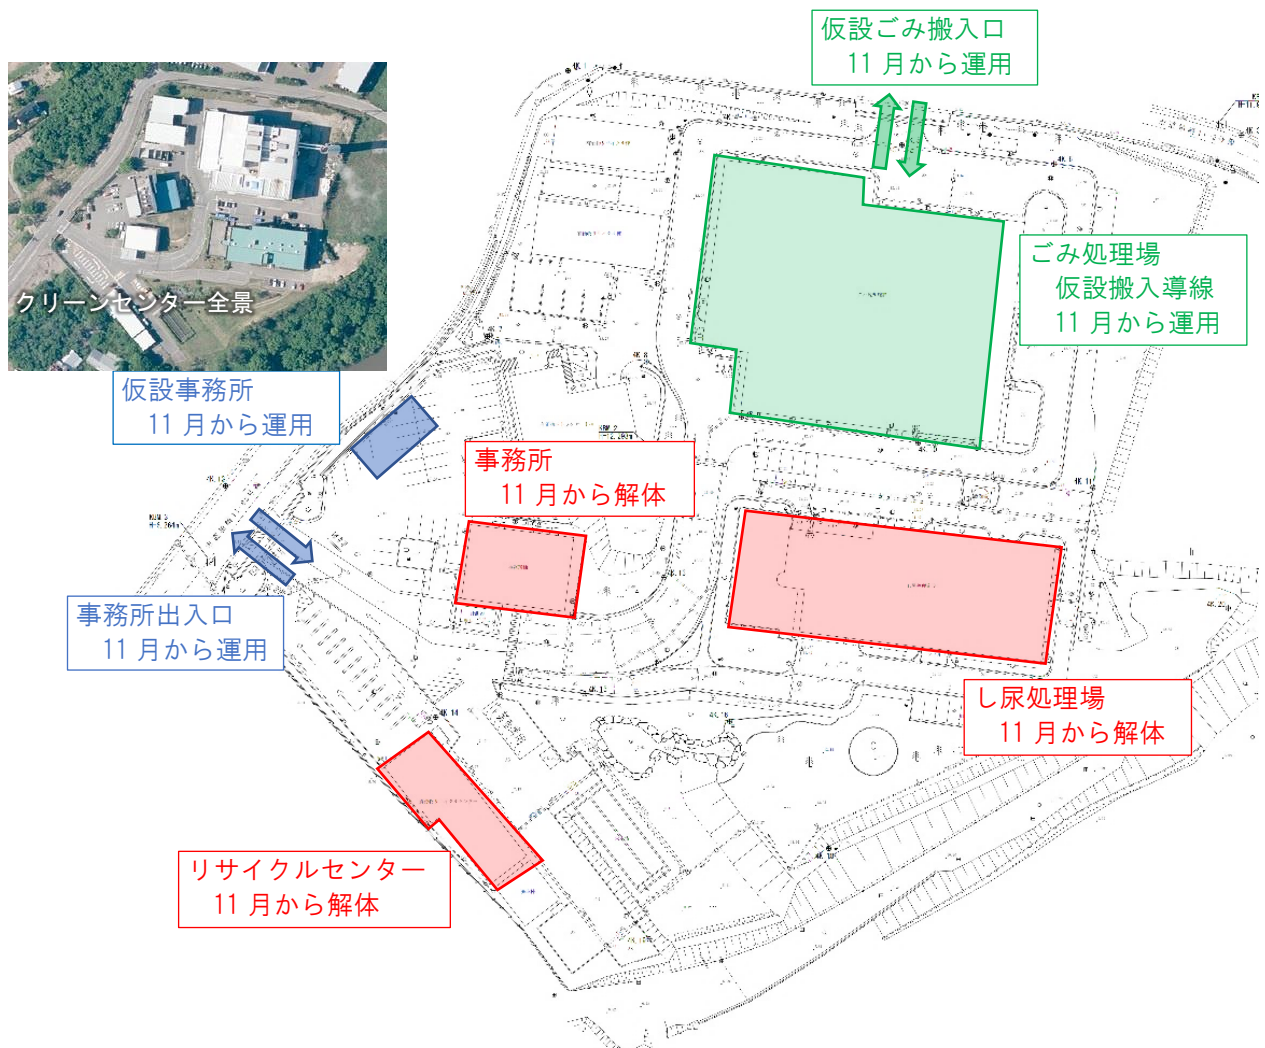

<今後のスケジュール>

項目	12月	R7.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
事業者選定	審査	(協議)	仮契約	契約								
仮設事務所						工事				設置	(移転)	運用
仮設搬入導線						工事						運用
事務所・し尿処理場・リサイクルセンター												解体へ

2 し尿処理場について

- 下水処理場のし尿受入施設の稼働開始は、能登半島地震の影響で下請け業者の確保が困難になったことや電気・機械設備の納期遅れにより、令和7（2025）年10月初旬となる見込み
- 工期の延長は想定範囲内であり、新ごみ処理場の整備スケジュールには影響しない
- し尿受入施設の稼働まで現し尿処理場を延長運転するよう、予算措置を含めた準備を進める



<今後のスケジュール>

項目	12月	R7.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
し尿処理場	稼働				延長					停止	清掃	解体
し尿受入施設（下水処理場）	工事				延長						稼働	

3 佐藤池リサイクルセンターについて

- 令和7（2025）年11月から稼働できるよう、佐藤池運動広場第4駐車場に建設する
- 今年度実施している地盤調査と実施設計が整い次第、建設関連予算を上程する予定
- 地域密着型として機能している佐藤池小規模リサイクルステーションは、田尻地域等の要望を受け、令和7（2025）年10月末まで稼働を延長するよう、予算措置を含めた準備を進める



4 松波リサイクルセンターについて

- クリーンセンター内の松波リサイクルセンターは、令和 7（2025）年 10 月下旬まで稼働した後、新ごみ処理場の建設のために解体する
- 令和 11（2029）年度以降に予定する新ごみ処理場が稼働した後、現在のごみ処理場を解体した跡地に新たなリサイクルセンターを設ける考え
- 一連の工事期間中は、佐藤池リサイクルセンターと西本町リサイクルセンターの 2 拠点体制となるが、これまで資源物回収に協力いただいた松波・西中通の地域から強い要望を受けたこと、市内 3 か所の拠点体制を維持したいことから、鯖石川改修記念公園駐車場の一部に松波小規模リサイクルステーションを設置する
- 駐車場機能を過度に損なうことのない位置にプレハブハウスを設置し、新たな松波リサイクルセンターが稼働するまで運営を維持するよう、予算措置を含めた準備を進める



<今後のスケジュール>

項目	R7. 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
佐藤池 リサイクルセンター				工事							稼働
佐藤池小規模 リサイクルステーション	稼働			延長						稼働終了	撤収
松波 リサイクルセンター	稼働									稼働終了	解体
松波小規模 リサイクルステーション					工事						稼働
西本町 リサイクルセンター	稼働										
